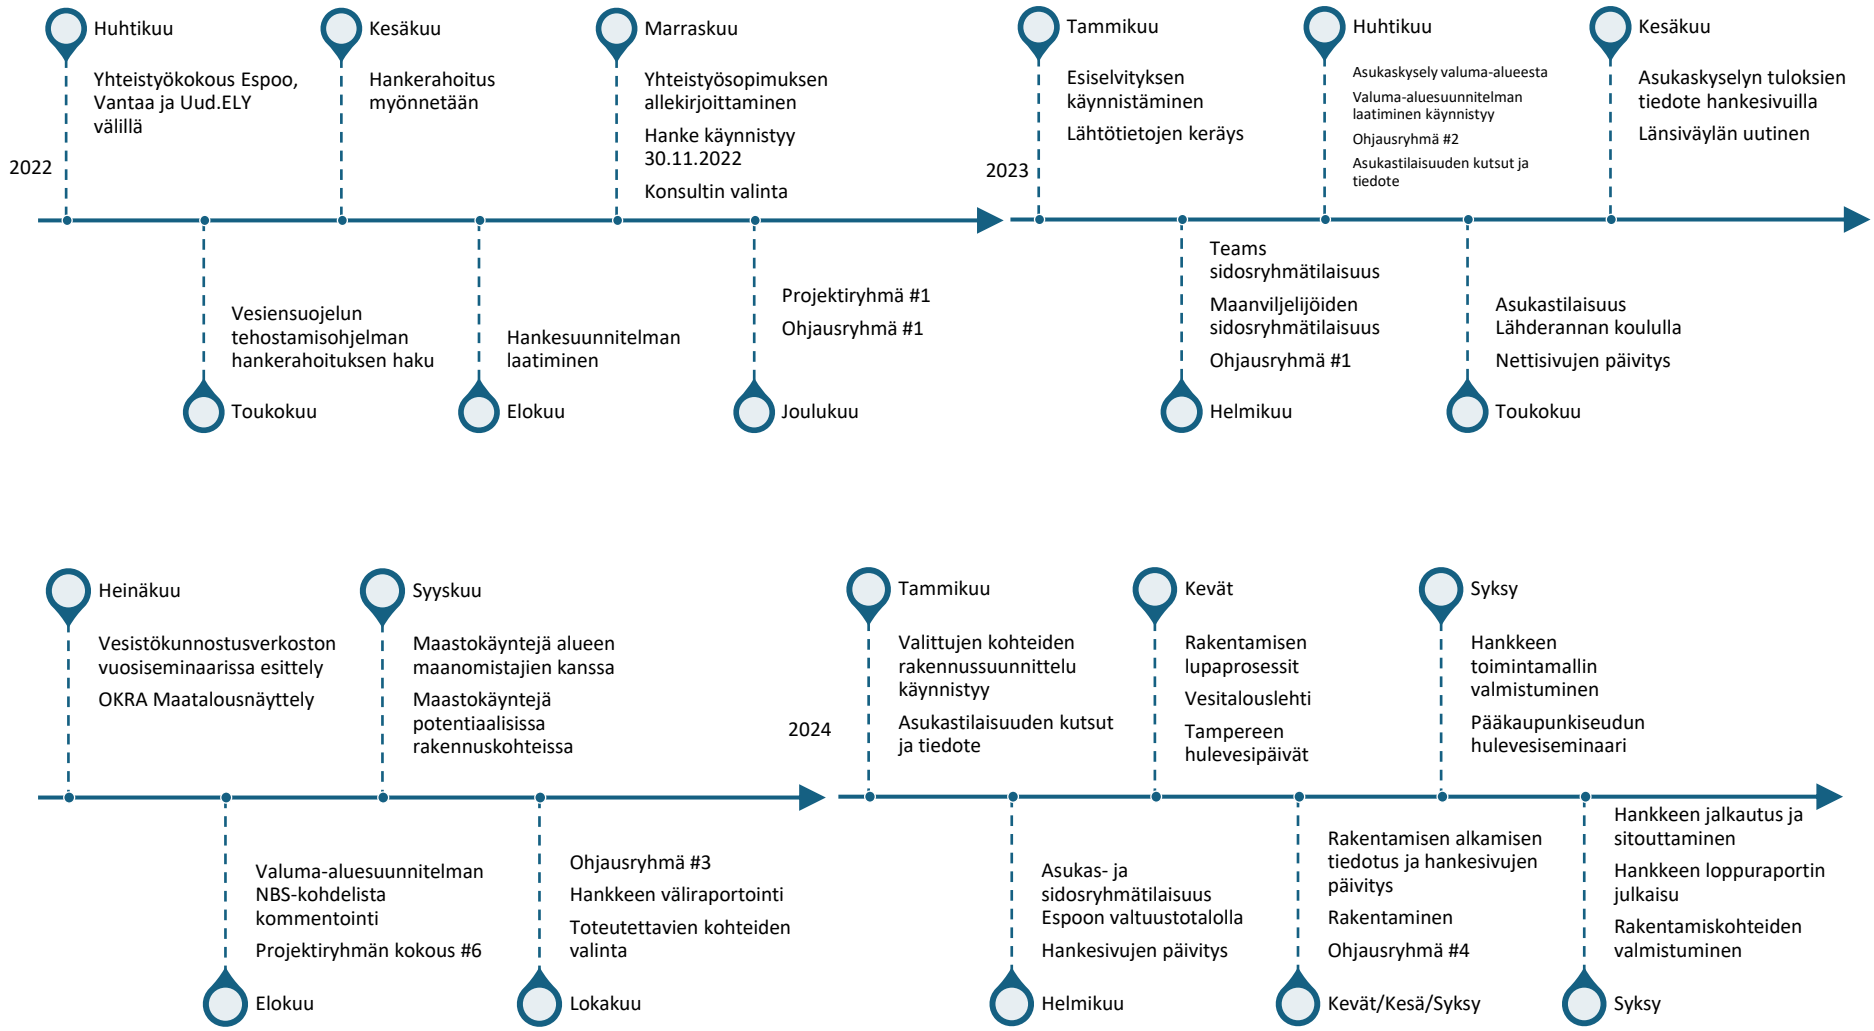
2022
Huhtikuu
Yhteistyökokous Espoo, Vantaa ja Uud.ELY välillä
Toukokuu
Vesiensuojelun tehostamisohjelman hankerahoituksen haku
Kesäkuu
Hankerahoitus myönnetään
Elokuu
Hankesuunnitelman laatiminen
Marraskuu
Yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen
Hanke käynnistyy 30.11.2022
Konsultin valinta
Joulukuu
Projektiryhmä #1
Ohjausryhmä #1
2023
Tammikuu
Esiselvityksen käynnistäminen
Lähtötietojen keräys
Helmikuu
Teams sidosryhmätilaisuus
Maanviljelijöiden sidosryhmätilaisuus
Ohjausryhmä #1
Huhtikuu
Asukaskysely valuma-alueesta
Valuma-aluesuunnitelman laatiminen käynnistyy
Ohjausryhmä #2
Asukastilaisuuden kutsut ja tiedote
Toukokuu
Asukastilaisuus Lähderannan koululla
Nettisivujen päivitys
Kesäkuu
Asukaskyselyn tuloksien tiedote hankesivuilla
Länsiväylän uutinen
Heinäkuu
Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa esittely
OKRA Maatalousnäyttely
Elokuu
Valuma-aluesuunnitelman NBS-kohdelista kommentointi
Projektiryhmän kokous #6
Syyskuu
Maastokäyntejä alueen maanomistajien kanssa
Maastokäyntejä potentiaalisissa rakennuskohteissa
Lokakuu
Ohjausryhmä #3
Hankkeen väliraportointi
Toteutettavien kohteiden valinta
2024
Tammikuu
Valittujen kohteiden rakennussuunnittelu käynnistyy
Asukastilaisuuden kutsut ja tiedote
Helmikuu
Asukas- ja sidosryhmätilaisuus Espoon valtuustotalolla
Hankesivujen päivitys
Kevät
Rakentamisen lupaprosessit
Vesitalouslehti
Tampereen hulevesipäivät
Kevät/Kesä/Syksy
Rakentamisen alkamisen tiedotus ja hankesivujen päivitys
Rakentaminen
Ohjausryhmä #4
Syksy
Hankkeen toimintamallin valmistuminen
Pääkaupunkiseudun hulevesiseminaari
Syksy
Hankkeen jalkautus ja sitouttaminen
Hankkeen loppuraportin julkaisu
Rakentamiskohteiden valmistuminen
